



1. RESULTADOS ATENCION A LA DENUNCIA

1.1. Objeto de la denuncia

Denuncia radicada con el número 3301 de 2016 de fecha 21 de enero de 2016, publicada en el Diario El Universal de Cartagena Bolívar, el día 19 de enero de 2016, relacionada con irregularidades en la ejecución del contrato para la pavimentación de la calle 25 en el Carmen de Bolívar.

1.2. Antecedentes.

El día veintiún (21) de enero de 2016, fue radicada en la Contraloría Departamental de Bolívar, publicada en el Diario El Universal de Cartagena Bolívar, el día 19 de enero de 2016, relacionada con irregularidades en la ejecución del contrato para la pavimentación de la calle 25 en el Carmen de Bolívar, denuncia que fue radicada bajo el consecutivo No. 3301 de 2016 en la oficina de Participación Ciudadana.

La oficina de participación ciudadana mediante memorando No. 110-PC-0000845, le asigna al ingeniero Carlos Alberto Alvarado Bello, Profesional universitario Grado 01 del área de auditoría fiscal de la Contraloría Departamental de Bolívar, la verificación de la denuncia No. 3301 de 2016, con el fin de emitir informe y realizar inspección física de las obras objeto de la denuncia mencionada anteriormente, para lo cual le hace entrega copia de la carpeta de la denuncia, la cual consta de 17 folios en total, con el fin de que conozca en detalle el alcance y las actuaciones que hasta el momento se han suscitado dentro del proceso de atención de la denuncia.

De acuerdo con la revisión documental, lo observado en el lugar de las obras, los registros fotográficos y la evaluación de toda la información aportada a la presente diligencia, se procede a dejar constancia de todo lo encontrado en el presente documento:

Durante la visita se pudo verificar que la intervención de la calle 25 se dio a través de 2 contratos, en el cual el primero consistió en la instalación de las tuberías de acueducto y alcantarillado de la calle 25 entre las carreras 39 y 50, así como también de la pavimentación y construcción de andenes de la calle 25 entre las carreras 47



y 50, el segundo contrato consistió en la pavimentación y construcción de andenes y bordillos de la misma calle, entre las carreras 43 y 47.

A continuación, se muestra los contratos que se ejecutaron en la calle 25:

1.3. Aspectos generales de los contratos

1.3.1 Contrato No. LP-007-2014

CONTRATO No.	: LP-007-2014
CONTRATISTA	: HUMBERTO HERNANDEZ AYCARDI
CONTRATANTE	: ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR
OBJETO	: CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERAS 50 Y 39 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
VALOR CONTRATADO	: \$1.698.644.098, 00
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	: ENERO 28 DE 2015
PLAZO	: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	: MARZO 10 DE 2015
ACTA DE TERMINACION	: JULIO 28 DE 2015
INTERVENTOR	: CONSORCIO GENESIS.

De acuerdo a la información aportada en la siguiente diligencia, se puede observar que el proceso contractual inicio en la vigencia 2014 y culmino en la vigencia 2015, el contrato se inició el día 10 de marzo de 2015 y se recibió el día 28 de julio de 2015, tal como consta en el acta de recibo finalización de obras, la cual se adjunta



al presente informe, pero llama la atención que la denuncia tiene fecha de 19 de enero de 2016 y la obra supuestamente fue recibida el día 28 de julio de 2015, con lo que al parecer, no legalizaron actas de suspensión y de reinicios, sino que solo hicieron ver que las obras se había recibido dentro del plazo contractual.

El presente contrato está enmarcado dentro del procedimiento de Licitación Pública de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, se observó dentro del expediente del contrato que se dispuso al auditor y de la revisión del Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP, que reposan los estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria, el certificado de disponibilidad presupuestal, el proyecto de pliego de condiciones, igualmente se aprecia la publicación del acta de cierre, el informe de evaluación, el acta de audiencia de del contrato así como también la resolución mediante la cual se adjudica el contrato.

De igual forma se encontró en la carpeta contractual, la minuta del contrato, así como las garantías exigidas en este, las actas de inicio, parciales y final del contrato, del acta final no se encontró el anexo de las cantidades de obras ejecutadas.

De las actas encontradas, se observa como anexo a la última acta cobrada el acta No. 5 (pero su título dice acta No. 6), en la cual se evidencia un avance físico de un 98.68% aproximadamente. El anexo del acta final se solicitó a la alcaldía municipal de El Carmen de Bolívar en varias ocasiones, sin que, a fecha de elaboración del presente informe se haya podido tener respuesta alguna de este anexo, debido a que este anexo no se ha podido encontrar, no se tiene claridad en que ítems se ejecutó el 1.32% restante del contrato.

A continuación, se muestran los pagos realizados al contratista, en los cuales se puede evidenciar que le fueron aplicados todos los descuentos de ley en la tabla No. 1.

Tabla No. 1



ACTAS PAGADAS	COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
ACTA PARCIAL No.1	32003	MARZO 20 DE 2015	385.105.097
ACTA PARCIAL No.2	43002	ABRIL 30 DE 2015	602.240.681
ACTA PARCIAL No.3	61701	JUNIO 17 DE 2015	153.158.781
ACTA PARCIAL No.4	71004	JULIO 10 DE 2015	325.447.522
ACTA PARCIAL No.5	82001	AGOSTO 20 DE 2015	211.610.191
ACTA PARCIAL No.6 (FINAL)	122802	DICIEMBRE 28 DE 2015	21.081.826
Fuente: Carpeta contractual		TOTAL PAGADO	1.698.644.098

1.3.2 Contrato No. LP-004-2014

CONTRATO No. : LP-004-2014

CONTRATISTA : CONSORCIO PAVIMENTAR EL CARMEN

CONTRATANTE : ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR

OBJETO : PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 A PARTIR DE LA CARRERA 49 K0+000, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

VALOR CONTRATADO : \$797.334.690, 00

SUSCRIPCION DEL CONTRATO : ABRIL 10 DE 2015

PLAZO : TRES (03) MESES

FECHA DE INICIO : SEPTIEMBRE 01 DE 2015

ACTA DE TERMINACION : DICIEMBRE 15 DE 2015

INTERVENTOR : EZEQUIEL JIMENEZ MARRUGO

De acuerdo a la información aportada en la siguiente diligencia, se puede observar que el proceso contractual inicio en la vigencia 2014 y culmino en la vigencia 2015, el contrato se suscribió el día 10 de abril de 2015 y se inició el día 1 de septiembre



de 2015, sin que se tenga claridad el porqué se presentó esta situación. El contrato se recibió el día 01 de diciembre de 2015, tal como consta en el acta de recibo finalización de obras, la cual se adjunta al presente informe.

El presente contrato está enmarcado dentro del procedimiento de Licitación Pública de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, se observó dentro del expediente del contrato que se dispuso al auditor y de la revisión del Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP, que reposan los estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria, el certificado de disponibilidad presupuestal, el proyecto de pliego de condiciones, igualmente se aprecia la publicación del acta de cierre, el informe de evaluación, el acta de audiencia de del contrato así como también la resolución mediante la cual se adjudica el contrato.

De igual forma se encontró en la carpeta contractual, la minuta del contrato, así como las garantías exigidas en este, las actas de inicio, parciales y final del contrato.

A continuación, se muestran los pagos realizados al contratista, en los cuales se puede evidenciar que le fueron aplicados todos los descuentos de ley, en la tabla No. 2.

Tabla No. 2

ACTAS PAGADAS	COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
ACTA PARCIAL No.1	102801	OCTUBRE 28 DE 2015	398.667.345
ACTA PARCIAL No.2	111803	NOVIEMBRE 18 DE 2015	164.409.582
ACTA PARCIAL No.3 (FINAL)	ILEGIBLE	DICIEMBRE 14 DE 2015	234.257.763
TOTAL PAGADO			797.334.690

Fuente: Carpeta contractual

1.4. Visita de verificación de las obras

El procedimiento de verificación de las obras se llevó a cabo el día dos (02) de febrero de 2017, con la participación del Arquitecto **SALVADOR NARVAEZ BERRIO** en su calidad de Profesional Universitario Adscrito a la Secretaría de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía Municipal de El Carmen de Bolívar y el ingeniero **CARLOS ALBERTO ALVARADO BELLO** Profesional Universitario Grado 01, en representación de la Contraloría Departamental de Bolívar.

De la inspección y verificación de las obras se levantó acta de visita la cual se anexa al presente informe, a continuación, se muestra el resultado de la inspección física de las obras:



1.4.1 Contrato No. LP 007-2014, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERAS 50 Y 39 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Una vez en el sitio de la obra, se pudo verificar la construcción de pavimento en concreto rígido, el cual tiene buena apariencia, al igual que los andenes y bordillos construidos, de igual forma se evidenciaron la instalación de las cámaras de inspección y de los registros domiciliarios, esto en lo que tiene que ver con la instalación del alcantarillado sanitario.

Una vez realizada la verificación de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato No. LP 007-2014, la revisión y análisis documental correspondiente, basado en la documentación dentro del expediente de la denuncia y la puesta a disposición a la comisión de la contraloría por parte de la administración municipal, se concluye lo siguiente:

- Las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en estudio se encuentran en funcionamiento y cumpliendo la labor encomendada a la comunidad beneficiada.
- Durante el recorrido por cada una de las áreas intervenidas, se verificaron y cuantificaron las obras ejecutadas, las cuales corresponden en su gran mayoría con las consignadas en las actas pagadas dentro del contrato.
- Es de aclarar, que varios de los ítems contratados, no se pudieron cuantificar al momento de la visita, en razón a que corresponde a obras temporales o transitorias o se encuentran bajo estructuras ya construidas, como demoliciones, excavaciones, rellenos, retiros de sobrantes, etc., de los cuales se evidencia su ejecución en las actas pagadas sin certificar sus cantidades.

A continuación, se muestran las cantidades de obras medidas en el sitio de las obras en la tabla No. 3, los cuales pertenecen a los ítems más representativos en el proyecto y que se encuentran identificados en los cuadros sombreados de gris, los otros ítems fueron tomados del acta No. 5 tales como están consignadas en el acta, debido a que no se encontró el anexo del acta final.

Tabla No. 3



ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND.	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	CAMPAMENTO	1,00	UN	4.105.215,00	4.105.215,00
2	TRAZADO Y REPLANTEO	2.618,64	ML	3.883,00	10.168.179,12
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE	1.985,14	M ²	16.758,00	33.266.976,12
4	CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO	3.435,68	ML	4.275,00	14.687.532,00
5	EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO)	4.963,50	M ³	49.190,00	244.154.713,00
6	ENTIBADO METALICO TIPO 3 Y MANEJO DE AGUAS INFILTRADAS	-	M ²	57.376,00	-
7	INSTALACION DE TUBERIA DE 16" PVC NOVAFORT INCLUYE TOPOGRAFIA, ALMACENAMIENTO, BAJADA DE LA TUBERIA AL FONDO DE LA ZANJA Y ATRAQUES	1.232,19	ML	47.580,00	58.627.647,78
8	INSTALACION DE TUBERIA DE 12" PVC NOVAFORT INCLUYE TOPOGRAFIA, ALMACENAMIENTO, BAJADA DE LA TUBERIA AL FONDO DE LA ZANJA Y ATRAQUES	733,81	ML	28.265,00	20.740.998,33
9	INSTALACION DE TUBERIA DE 8" PVC NOVAFORT INCLUYE TOPOGRAFIA, ALMACENAMIENTO, BAJADA DE LA TUBERIA AL FONDO DE LA ZANJA Y ATRAQUES	1.379,34	ML	12.800,00	17.655.552,00
10	INSTALACION DE KIT SILLAS YEE DE 12"X6"	115,00	UN	10.540,00	1.212.100,00
11	INSTALACION DE SILLAS YEE DE 16"X6"	189,00	UN	26.350,00	4.980.150,00
12	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ESP = 0,20 MTS	1.522,00	M ²	163.580,00	248.968.760,00
13	CONTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION CON DIAMETRO INTERNO DE 1,2 METROS INCLUYE EL CONCRETO Y EL REFUERZO DEL MANHOLL, RETIRO DE SOBRANTE FORMALETA, ENTIBADO Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO	10,00	UN	2.685.000,00	26.850.000,00
14	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION	2.872,65	M ³	10.566,00	30.352.398,77



15	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTO	1.322,82	M ³	50.040,00	66.194.112,96
16	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE 8"	345,00	ML	9.271,00	3.198.495,00
17	ROTURA DE ANDENES	520,00	M ²	9.344,00	4.858.880,00
18	EXCAVACION A MANO PARA DOMICILIARIAS	120,00	M ³	17.075,00	2.049.000,00
19	CONSTRUCCION DE REGISTROS, PAÑETADO DE 0.60X0.60	-	UND	185.142,00	-
20	RECONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.07 MTS DE ESPESOR	-	M ²	46.783,00	-
21	CORTE DE PAVIMENTO	-	ML	4.275,00	-
N	CONSTRUCCION BORDILLOS DE 15X20	473,50	ML	18.792,00	8.898.012,00
N	SELLOS DE JUNTAS	777,00	ML	7.850,00	6.099.450,00
N	REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO	-	M2	163.580,00	-
N	REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO	-	ML	89.540,00	-
N	REPOSICION DE REDES DE AGUA (MANGUERA DE 1/2" 16") TUB DE 3" Y 4"	-			
N	REPSICION DE REDES DE GAS	-			
N	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA ROTURA DE PAVIMENTO	700,00	M3	19.485,00	13.639.500,00
N	MANEJO Y CONTROL DE AGUAS LLUVIAS, NIVEL FREATICO, RESIDUALES Y OTRAS	3,30	KM	24.036.644,00	79.389.189,27
SUB TOTAL ITEM 1					900.096.861,34
SUMINISTRO TUBERIAS					
24	SUMINISTRO TUBERIA PVC NOVAFORT 12", INCLUYE SELLO DE CAUCHO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	756,50	ML	91.326,00	69.088.119,00
25	SUMINISTRO DE SILLA YEE DE 16" X 6"	115,00	UN	284.531,00	32.721.065,00
26	SUMINISTRO DE SILLA YEE DE 12" X 6"	189,00	UN	244.500,00	46.210.500,00
27	SUMINISTRO TUBERIA PVC NOVAFORT 16", INCLUYE SELLO DE CAUCHO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	1.270,30	ML	150.700,00	191.434.210,00
28	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 6" INCLUYE SELLO DE CAUCHO	1.422,00	ML	34.655,00	49.279.410,00
SUB TOTAL ITEM 3					388.733.304,00



	TOTAL COSTO DIRECTO				1.288.830.165,34
	ADMINISTRACION	%	23,00	296.430.938,00	
	IMPREVISTO	%	2,00	25.776.603,00	
	UTILIDAD	%	5,00	64.441.508,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				386.649.049,00

Fuente: Actas parciales 1,2,3,4 y 5 del contrato y visita de obras

VALOR TOTAL 1.675.479.214,34

Valor contratado	1.698.044.098,00
Valor medido y ejecutado por el contratista	1.675.479.214,34
Valor por ejecutar	22.564.883,66

El valor que aparece por ejecutar no quiere decir que el contrato no se haya ejecutado en un 100%, lo que pasa es solo se lograron evaluar las actas parciales 1,2,3,4 y 5, faltado evaluar las cantidades de obras del acta final, la cual nunca apareció muy a pesar de que fue solicitadas en varias ocasiones. Cabe anotar, que las obras cobradas en el acta final están por el orden de los \$21.081.826,00, tal como se muestra en el comprobante de egreso No. 122802 del 28 de diciembre de 2017.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y todo lo observado en el recorrido de las obras ejecutadas dentro del contrato, se presume que el contratista cumplió a cabalidad con lo encomendado en las especificaciones técnicas consignadas en el contrato No. LP 007-2014 y sus modificaciones.

1.4.2 Contrato No. LP 004-2014, cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 A PARTIR DE LA CARRERA 49 K0+000, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Una vez en el sitio de la obra, se pudo verificar la construcción de pavimento en concreto rígido, el cual tiene buena apariencia, al igual que los andenes y bordillos construidos, de igual forma se evidenciaron la instalación de las cámaras de inspección y de los registros domiciliarios, esto en lo que tiene que ver con la instalación del alcantarillado sanitario, los cuales pertenecen al contrato No. LP 007-2014.



Una vez realizada la verificación de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato No. LP 004-2014, la revisión y análisis documental correspondiente, basado en la documentación dentro del expediente de la denuncia y la puesta a disposición a la comisión de la contraloría por parte de la administración municipal, se concluye lo siguiente:

- Las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en estudio se encuentran en funcionamiento y cumpliendo la labor encomendada a la comunidad beneficiada.
- Durante el recorrido por cada una de las áreas intervenidas, se verificaron y cuantificaron las obras ejecutadas, las cuales corresponden en su gran mayoría con las consignadas en las actas pagadas dentro del contrato.
- Es de aclarar, que varios de los ítems contratados, no se pudieron cuantificar al momento de la visita, en razón a que corresponde a obras temporales o transitorias o se encuentran bajo estructuras ya construidas, como demoliciones, excavaciones, rellenos, retiros de sobrantes, etc., de los cuales se evidencia su ejecución en las actas pagadas sin certificar sus cantidades.

A continuación, se muestran las cantidades de obras medidas en el sitio de las obras en la tabla No. 4, los cuales pertenecen a los ítems más representativos en el proyecto y que se encuentran identificados en los cuadros sombreados de gris, los otros ítems fueron tomados del acta No. 2 (final) tales como están consignadas en el acta.

Tabla No. 4

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización , trazado y replanteo	M2	2.882,00	648,00	1.867.536,00
1,2	Excavación	M3	2.163,00	9.431,00	20.399.253,00
1,3	Inspección y reubicación de agua potable	ML	328,00	12.362,00	4.054.736,00
1,4	Demolición de pavimento existente en mal estado	M2	2.305,00	10.000,00	23.050.000,00
1,5	Conformación de subrasante	M2	2.882,00	1.481,00	4.268.242,00
1,6	Retiro de material sobrante	M3	2.182,00	8.542,00	18.638.644,00
1,7	Demolición de andenes existentes	ML	160,00	7.466,00	1.194.560,00



2	CIMENTACIONES		-		
2,1	Relleno y compactación de material seleccionado calzada	M3	1.588,52	97.642,00	155.106.269,84
2,2	Relleno de material seleccionado andén	M3	38,01	84.890,00	3.226.668,90
3	ESTRUCTURAS		-		
3,1	Pavimento en concreto de 550 P.S.I. h=0,20 mts.	M3	621,20	579.664,00	360.087.276,80
3,2	Bordillo en concreto H=0,15 acero de 3/8" corrido y 1/4" c/d 0,5 Lc=0,4m	ML	658,50	30.255,00	19.922.917,50
3,3	Andén en concreto de 3000 psi e=0,075	M2	222,14	41.444,00	9.206.370,16
4	Reubicación de cámaras de teléfono	UND	4,00	133.956,00	535.824,00
5	Nivelación y reconstrucción de cámaras	UND	4,00	339.244,00	1.356.976,00
6	Acero de refuerzo para juntas fy=4200 kg/cm2	KG	3.550,40	4.492,00	15.948.396,80
TOTAL COSTO DIRECTO					638.863.671,00
AIU (25%)			% 25,00	159.715.917,75	

Fuente: Actas parciales 1,2 y final del contrato y visita de obras

VALOR TOTAL **798.579.588,75**

Valor contratado	797.334.589,13
Valor medido y ejecutado por el contratista	798.579.588,75
Valor por ejecutados demás	1.244.899,62

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y todo lo observado en el recorrido de las obras ejecutadas dentro del contrato, se presume que el contratista cumplió a cabalidad con lo encomendado en las especificaciones técnicas consignadas en el contrato No. LP 004-2014 y sus modificaciones.

1.5. Registro fotográfico

A continuación, se muestra el registro fotográfico del estado actual de cada uno de los proyectos.

Fotografía No. 1	Fotografía No. 2
Panorámica pavimento LP 004-2014	Panorámica pavimento LP 004-2014



Fotografía No. 3

Panorámica pavimento LP 007-2014

Fotografía No. 4

Panorámica pavimento LP 007-2014




Fotografía No. 5

Pavimento, andenes y bordillos LP 007-2014

Fotografía No. 6

Pavimento, andenes y bordillos LP 007-2014

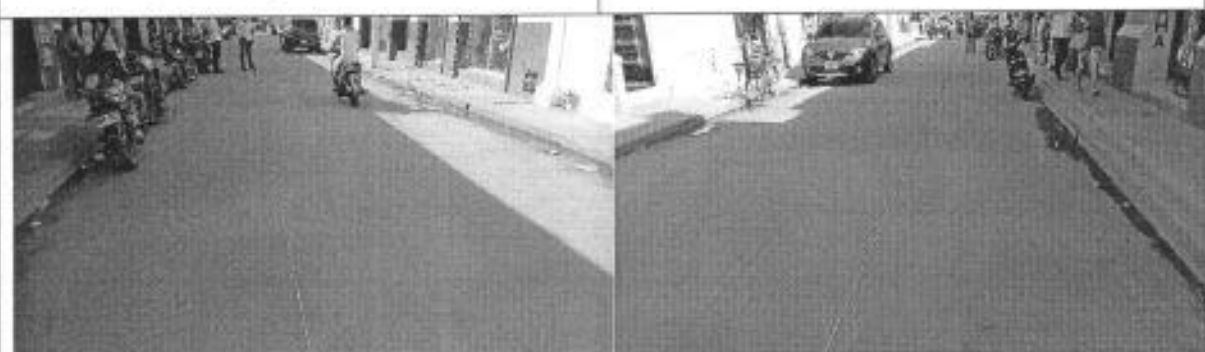


Fotografía No. 7

Cámaras de inspección LP 007-2014

Fotografía No. 8

Cámaras de inspección LP 007-2014

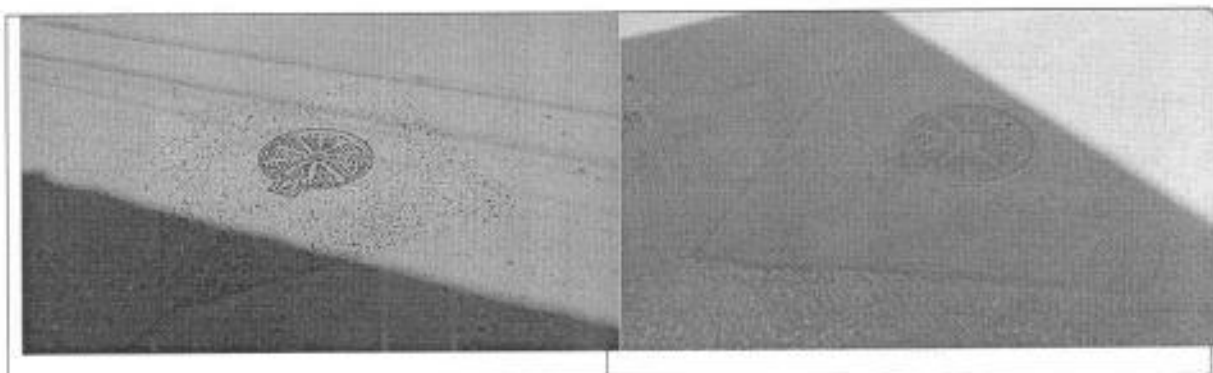

Fotografía No. 9

Panorámica pavimento LP 004-2014



Fotografía No. 10

Panorámica pavimento LP 004-2014



Fotografía No. 11

Panorámica pavimento LP 004-2014



Fotografía No. 12

Panorámica pavimento LP 004-2014



Fotografía No. 13

Panorámica pavimento LP 004-2014



Fotografía No. 14

Panorámica pavimento LP 004-2014





Fotografía No. 15

Panorámica pavimento LP 004-2014

Fotografía No. 16

Panorámica pavimento LP 004-2014



Fotografía No. 17

Panorámica pavimento LP 004-2014

Fotografía No. 18

Panorámica pavimento LP 004-2014



Fotografía No. 19

Panorámica pavimento LP 004-2014

Fotografía No. 20

Finalización pavimento LP 004-2014



1.6. Observaciones (Hallazgos)

De acuerdo a la documentación aportada por la alcaldía de El Carmen de Bolívar en la presente diligencia, todo lo revisado en las carpetas que hacen parte de la denuncia No. 3301 de 20163 y todo lo plasmado en este informe, no se encontraron evidencias que conlleven a determinar la configuración de observación alguna.

CARLOS ALBERTO ALVARADO BELLO
Profesional Universitario
Área de Auditoría Fiscal

Anexos:

- Copia del acta visita a las obras (01 folio)
- Oficio solicitud información (02 folios)
- Respuesta solicitud información (01 folio + 01 CD-ROM)
- Reiteración solicitud de información (01 folio dos caras)
- Respuesta oficio reiteración (01 folio)
